Réseau de transport d'électricité

Convention d'Exploitation / Conduite des Installations d'un Producteur en période d'essai


Rappels












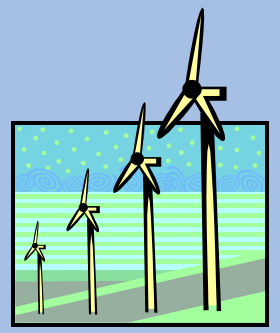

Demande de raccordement

T+ 3mois

T+ 3mois

Accord PTF et paiement 10%

Signature et paiement 30%

Solde paiement

Mise sous tension de l'ouvrage de raccordement

Premier couplage

ARD

études Préliminaires

études détaillées et Procédures administratives

Travaux

Essais de conformité de l'installation

PTF

Entrée en file d'attente

Convention Engagements de performances

Convention de raccordement

CART


Convention d'exploitation / conduite pour essais

Cadre contractuel Définitif

Architecture

Convention d'Exploitation / Conduite
en période d'essai de l'installation de production raccordé au poste du RPT

- Document signé à **l'échelon local entre les employeurs délégataires Producteur, URSE et URTE**
- A pour objectif de préciser les **modalités pratiques liées au site de production à mettre en œuvre dans le cadre des relations d'exploitation/conduite durant la phase de d'essais de l'installation**

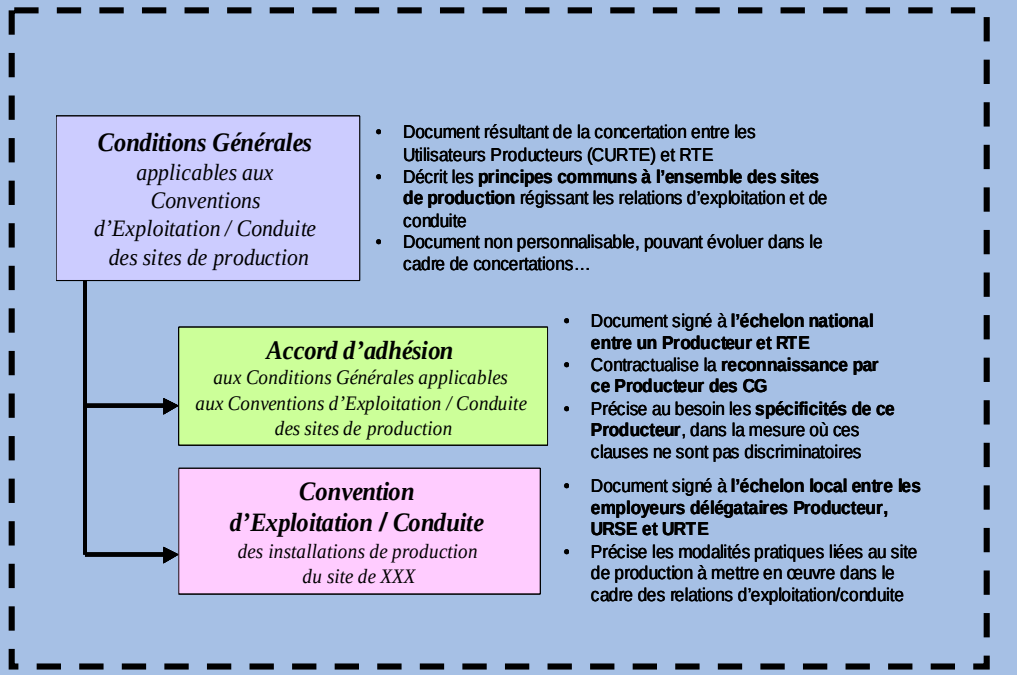

Avenant aux CG pour les ENR

Principaux points à retenir par rapport à la trame « définitive »

➔ **Cas des nouveaux groupes installés dans un site existant ou raccordés en piquage** *(gestion des indisponibilités durant les essais, coordination entre les conventions…)*

- Préambule
- § 2.2.2

➔ **Prestations de conduite et d'exploitation par un tiers pour le compte du producteur durant les essais**

- § 1.4.1

Principaux points à retenir

- ➔ **Programme d'essais** *(planification, suivi)*
  - Chapitre 2
- ➔ **Modalités de participation aux réglages de la tension et de la fréquence**
  - Article 3.7
- ➔ **Suppression des articles relatifs au SAS**

Points nécessitant une instruction complémentaire

➔ **Modalités associées à la mise en service partielle**

- Article 2.6

➔ **Entrée en vigueur et durée**

- Article 5.2

➔ **Pour ces deux points, nécessité de mener une réflexion sur :**

- la nature des essais et les performances attendues lors des différentes phases de MES partielle,
- le traitement des non conformités et de fait les modalités de sortie de la convention pour essais

➔ Ces réflexions s'inscrivent dans le chantier de reprise de la trame de la Convention d'Engagement de Performances
